



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN

KLASA: 024-01/22-01/3  
URBROJ: 2186-02/1-22-1  
Varaždin, 7. srpnja 2022.

**VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
**- svima-**

**PREDMET: Odgovor na pitanje vijećnice Županijske skupštine**  
**SNJEŽANE CERJAN**  
**- dostavlja se.**

Na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 18. svibnja 2022. godine, vijećnica Županijske skupštine SNJEŽANA CERJAN, postavila je pitanje:

„Bilo je dosta riječi već ovdje o našim cestama, projekt aglomeracije na potezu od Grede, odnosno od Općine Maruševac pa prema Varaždinu. Svakodnevno se vozim ovom dionicom. Prošle godine smo u to doba jednostavno zaobilazili grabe na cesti, vozili se obilaznim pravicima, danas opet. Pitam da li je to isplativo? Prošle godine smo završili nešto, asfaltirano je, krenuli smo se normalno voziti i sad prije mjesec dana na potezu Jurketinec pa prema Vidovcu, Nedeljancu, opet se nešto kopa, prekapa. Dakle moje pitanje je aglomeracija, što se i sad ponovno radi, zašto se ponovno kopa, zašto se ponovno uništava asfalt koji je prošle godine učinjen i kad bi se moglo očekivati da bi bilo gotovo?“

**ODGOVOR:**

U prilogu dostavljamo odgovor VARKOM d.d.



Primljeno:	13. 06. 2022
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.

Klasa: NP-13-03/17-01/832

Ur. broj: S-62/14-22-235

Varaždin, 07.06.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN  
FRANJEVAČKI TRG 7  
42000 VARAŽDIN

**PREDMET:** Pregled aktivnosti i planiranih radova po podsustavima na projektu:  
„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“  
- dostavlja se -

Veza na: Pitanje vijećnice Županijske skupštine, klasa: 024-01/22-01/2, urbroj: 2186-02/1-22-6 od 1. lipnja 2022.

Poštovani,

Temeljem Pitanja vijećnice Županijske skupštine Varaždinske županije dostavljenog od strane Župana Varaždinske županije klasa: 024-01/22-01/2, urbroj: 2186-02/1-22-6 od 01.06.2022. godine dostavljamo Vam izvještaj o statusu i dinamici projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ za razdoblje do 30.05.2022. godine, kao i odgovor na postavljeno pitanje.

**Izvještaj o statusu i dinamici po elementima projekta:**

**1) UGOVOR A1 - Dogradnja sustava odvodnje - Grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava odvodnje**

- Ugovor potpisan 9.7.2019.
- Vrijednost ugovora 95.482.658,32 kn.
- Rok dovršetka 15.09.2022.
- S 31.05.2022. ukupno realizirano 92.998.910,68 kn ili 97%.
- Izvedeni su svi radovi po predmetnom ugovoru.
- Ishođena jedna od pet uporabnih dozvola.

**2) UGOVOR A2 - Dogradnja sustava odvodnje – Općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec**

- Ugovor potpisan 8.7.2019.
- Vrijednost ugovora 204.619.759,00 kn.
- Rok dovršetka 30.08.2022.
- Izvode se radovi postavljanja kanalizacijskih cjevovoda, asfaltiranja i uređenja okoliša crpnih stanica.
- S 31.05.2022. ukupno realizirano 170.184.504,62 kn ili 83%.
- Na području Općine Cestica preostalo je za izvesti oko 400 m cjevovoda i 4 armirano-betonskih okana u pojasu državne ceste DC2, završno sanirati prometnice pod ingerencijom ŽUC-a i Općine (oko 2.300 m habajućeg sloja asfalta), te izvedba oko 30 kućnih priključaka.
- Na području Općine Vinica su preostali radovi na završnoj sanaciji prometnica, odnosno do kraja lipnja 2022. planirano je prekriti nosivim slojem asfalta sve prometnice koje su trenutno pod šljunkom, osim Gornje ulice u naselju Marčan gdje se čeka završetak radova na izgradnji oborinske odvodnje koje izvodi



Sustav odvodnje i pročišćavanja  
otpadnih voda aglomeracije Varaždin





Županijska uprava za ceste. Asflatiranje svih prometnica završnim slojem asfalta planiran je tijekom srpnja 2022.

- Na području Općina Sračinec i Petrijanec su preostali radovi na završnoj sanaciji prometnica.
- Preostalo je urediti okoliš oko crpnih stanica.
- 1.12.2021. godine predan je zahtjev za izmjenom i dopunom građevinske dozvole podsustava Sračinec, a izdavanje predmetne izmjene očekuje se do 10.6.2022. godine.
- Nije ishođena nijedna od šest uporabnih dozvola.

### 3) UGOVOR A3 - Dogradnja sustava odvodnje – Općina Maruševac i Vidovec


- Ugovor potpisan 20.10.2017.
- Vrijednost ugovora 101.793.887,26 kn.
- Rok dovršetka 24.11.2022.
- Izvode se radovi postavljanja kanalizacijskih cjevovoda i na izvedbi crpnih stanica.
- S 31.05.2022. ukupno realizirano 82.631.185,90 kn ili 81%.
- Preostalo je za izvesti 1.800 m cjevovoda u pojasu državne ceste DC35 na području općine Vidovec i 1.000 m cjevovoda u pojasu državne ceste DC35 na području općine Maruševac. Nakon izvedbe cjevovoda i pripadajućih kućnih priključaka izvesti će se završna sanacija državne prometnice.
- Od ostalih radova, potrebno je izvesti završnu sanaciju prometnica pod ingerencijom ŽUC-a, kao i radove na izvedbi preostalih crpnih stanica.
- U tijeku je izrada izmjene i dopune idejnog projekta za podsustav Vidovec i Maruševac.
- Nije ishođena nijedna od dvije uporabne dozvole.

### 4) UGOVOR A4 - Dogradnja sustava odvodnje – Općina Beretince, Sveti Ilija, Gornji Knežinec i Trnovec Bartolovečki

- Ugovor je potpisan 20.10.2017.
- Vrijednost ugovora 66.029.655,32 kn.
- Rok dovršetka 01.09.2022.
- S 31.05.2022. ukupno realizirano 59.947.802,10 kn ili 91%.
- Izvedeni su svi radovi po predmetnom ugovoru.
- Ishođena je uporabna dozvola za podsustav Knežinec.
- Zahtjev za ishođenje uporabne dozvole na podsustav Sveti Ilija predan je na Upravni odjel Varaždinske županije 3.2.2022. godine, a tehnički pregled će se održati 15.6.2022. godine.
- Preostalo je za ishoditi izmjenu lokacijske/grādevinske dozvole za podsustave Beretince i Trnovec Bartolovečki.
- Potrebno je ishoditi uporabne dozvole za podsustave Beretince, Trnovec Bartolovečki i Knežinec – modernizacija.

	Ugovoreno A1-A4	Ukupno realizirano do 05/2022
kn	467.925.959,90	406.006.665,32
%	100%	87%



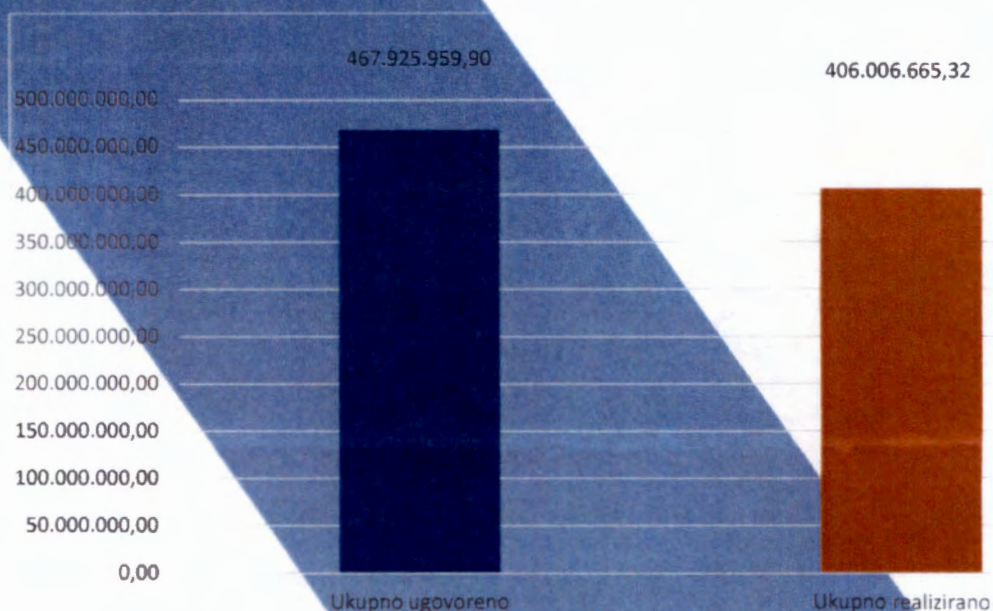

Prilikom izvođenja radova na sustavu odvodnje i usklađivanja sa stvarnim stanjem na terenu došlo je do određenih odstupanja od lokacijskih dozvola, te je prije predaje zahtjeva za izdavanjem uporabne dozvole potrebno ishoditi izmjene i dopune lokacijskih i građevinskih dozvola.

Preduvjet za izmjenu lokacijskih dozvola je provedba Objedinjenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za: IZMJENE ZAHVATA NA SUSTAVU ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN.

8. rujna 2021. godine Zahtjev za provedbu je predan na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a na traženje Ministarstva od 2. ožujka 2022. godine, 19.4.2022. godine predana je i dopuna predmetnog Zahtjeva.

Zaključno, ukoliko Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provede traženi postupak za aktivnosti na sustavu odvodnje, od A1 do A4 do najkasnije kraja lipnja 2022. godine, za očekivati je da će sve uporabne dozvole biti izdane do kraja 2022. godine.

#### **5) UGOVOR A5 - Projektiranje, rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a Varaždin na 127.000 ES i treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda**

- Varkom d.d. dovršio je postupak izrade glavnih projekata, a u tijeku je postupak ishođenja građevinskih dozvola za četiri funkcionalne cjeline Rekonstrukcije i dogradnja UPOV-a Varaždin na 127.000 ES i treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda.
- Dana 28.09.2021. nadležnoj stručnoj službi Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine predani su zahtjevi i cjelovita dokumentacija za izdavanje građevinskih dozvola.
- Ugovor potpisan 14.04.2022.
- Vrijednost ugovora 209.898.850,00 kn.
- Rok dovršetka: 19 mjeseci od uvođenja u posao.



**Vezano na pitanje postavljeno od strane vijećnice Županijske skupštine očitujemo se kako slijedi:**

Radovi na izvedbi sustava odvodnje u pojasu državne ceste DC35 izvode se po terminskom planu, te će isti biti izvedeni do 24.11.2022. godine. Sukladno Posebnim uvjetima građenja, izdanim od strane Hrvatskih cesta kao upravitelja navedene prometnice, kako bi se smanjio negativni utjecaj na odvijanje prometa tijekom izvođenja radova radovi se izvode na izdvojenim dionicama od po 500 m. Prekopava se kolnik uzdužno za polaganje glavnog cjevovoda i poprečno za kućne priključke. Nakon ugradnje cjevovoda i zatrpavanja rova izvodi se sanacija jednim nosivim slojem asfalta. Prije ugradnje drugog - završnog (habajućeg) sloja asfalta po čitavoj širini kolnika izvodi se glodanje postojećeg završnog sloja, radi visinske prilagodbe na projektiranu visinu kolnika.

Preostalo je još ugraditi kanalizacijske cjevovode na preostalim dionicama u pojasu državne ceste u Cargovcu i Vidovcu dužine oko 1,8 km (na području općine Vidovec), te u Jurketincu i Gredi dužine oko 1,0 km (na području općine Maruševac).

U privitku dostavljamo očitovanje Izvođača radova i Nadzornog inženjera.

**Zaključno, ističemo sljedeće:**

- Radovi na izgradnji sustava odvodnje ugovoreni kroz četiri ugovora (A1 do A4) biti će završeni do kraja 2022. godine, a izdavanje uporabnih dozvola ovisi o provedbi Objedinjenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, kao i ishođenju izmjena i dopuna lokacijskih/građevinskih dozvola.
- Do listopada 2022. godine potrebno je provesti 13 tehničkih pregleda te izdati isto toliko uporabnih dozvola.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

Tehnički direktor:  
Marijan Cesarec, dipl. ing. građ.

Direktor:  
Bruno Ister, dipl. ing. el.

Privitak: Očitovanje Izvođača radova  
Očitovanje nadzornog inženjera

DIONIČKO DRUŠTVO  
**varkom**  
VARAŽDIN 1



**PRE – CON d.o.o.**  
za usluge i trgovinu Varaždin

Ulica hrvatskih branitelja 7, 42 000 Varaždin  
TEL/FAX 042 206-237, GSM 098 90 73 234  
e-mail: [blazenko.premuzic@vz.t-com.hr](mailto:blazenko.premuzic@vz.t-com.hr), OIB 51808332482  
račun HR38 2484008-1106116855, Raiffeisenbank Austria d.d.

Varaždin, 06.06.2022.

n/r investitora: Varkom d.d. Varaždin

**Predmet:** Očitovanje nadzornog inženjera broj 13/22

PROJEKT : SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA  
AGLOMERACIJE VARAŽDIN A-3. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OPĆINA  
VIDOVEC I MARUŠEVEC  
UGOVOR: KLASA NP-09-01/17-01/14; Ur.Br.: 6-42/950-17-23

Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže i kućnih priključaka u pojasu državne ceste DC 35 na području Općina Vidovec i Maruševac izvode se sukladno izdanoj suglasnosti nadležnog upravitelja ceste (Hrvatske ceste). Uvjetovana je izgradnja kanalizacije po dionicama određene dužine, koje nisu smještene prostorno u kontinuitetu nego naizmjenično.

Prekopava se kolnik uzdužno za polaganje glavnog cjevovoda i poprečno za kućne priključke. Nakon ugradnje cjevovoda i zatrpavanja rova izvodi se sanacija jednim nosivim slojem asfalta. Prije ugradnje drugog - završnog (habajućeg) sloja asfalta po čitavoj širini kolnika izvodi se glodanje postojećeg završnog sloja, radi visinske prilagodbe na projektiranu visinu kolnika.

Preostalo je još ugraditi kanalizacijske cjevovode na preostalim dionicama u pojasu državne ceste u Cargovcu i Vidovcu dužine oko 1,8 km (na području općine Vidovec), te u Jurketincu i Gredi dužine oko 1,0 km (na području općine Maruševac).

S poštovanjem

N.I. za građevinske radove:  
Blaženko Premužić, dipl.ing.građ.

  
**PRE-CON d.o.o.**  
Varaždin, Ulica hrvatskih branitelja 7

**TEG****VODOGRADNJA****VARAŽDIN** dioničko društvo

Primatelj:	gđa. Tamara Leljak, Varkom d.o.o. Varaždin
Mjesto i datum:	Čakovec, 07.06.2022.
Nr:	MO-288/22
Projekt:	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin – Aktivnost 3 – Izgradnja sustava odvodnje općina Maruševac i Vidovec
Predmet:	Očitovanje o stanju radova

Poštovana,

Projektom Dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda općina Vidovec i Maruševac predviđena je ugradnja 56 km gravitacijskog cjevovoda, od čega 10 km u trupu državne ceste DC35 na području ove dvije općine. Sukladno Posebnim uvjetima građenja, izdanim od strane Hrvatskih cesta kao upravitelja navedene prometnice, kako bi se smanjio negativni utjecaj na odvijanje prometa tijekom izvođenja radova radovi se izvode na izdvojenim dionicama od po 500m.

U trupu državne ceste DC35 na području općine Vidovec, naseljima Vidovec i Čargovec, preostalo je za izvesti još 1.800 m gravitacijskog cjevovoda, dok je na području naselja Greda, općina Maruševac preostalo za izvesti 1.000 m cjevovoda. Napominjemo kako dionice koje su sanirane završnim slojem asfalta nisu ponovno raskopavane.

Završetak svih radova na području općina Vidovec i Maruševac planiran je do početka studenog 2022.

Predstavnik izvođača:

Marijo Okreša, ing. građ.



TEGRA d.o.o. Čakovec, Mihovljanska 70, | 40 000 ČAKOVEC | HR

T: +385 40 396 290, +385 40 396 077 +385 40 396 125, FP: +385 40 396 123, +385 40 396 421.

E-mail: [info@tegra.hr](mailto:info@tegra.hr), web: [www.tegra.hr](http://www.tegra.hr).

OIB: 5234 7609 859, MIB: 1119834, Poslovni rč. IBAN: HR37 2407 0001 1006 3830 8

Uprava: Ivan KOLARIĆ - predsjednik, Silvija KOLARAC - član

Temeljni kapital: 22.826.200,00 kuna, upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS 070000473

